


伊賀市新斎苑建設工事 12月度工事予定

・主要工事		・大型車両
1 / 日	休工	8:15~17:30 4・10tトラック
2 / 月	植栽工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10tトラック
3 / 火	植栽工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10tトラック
4 / 水	植栽工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10tトラック
5 / 木	植栽工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10tトラック
6 / 金	植栽工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10tトラック
7 / 土	植栽工事・舗装工事	8:15~17:30 4・10tトラック
8 / 日	休工	—
9 / 月	植栽工事・舗装工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
10 / 火	植栽工事・舗装工事・外構工事	8:15~17:30 4・10tトラック
11 / 水	植栽工事・困障工事・サイン工事・乗入復旧	8:15~17:30 4 tトラック
12 / 木	植栽工事・困障工事・サイン工事・乗入復旧	8:15~17:30 4 tトラック
13 / 金	乗入復旧	8:15~17:30 4 tトラック
14 / 土	乗入復旧	8:15~17:30 4 tトラック
15 / 日	休工	
16 / 月	検査手直し	
17 / 火	検査手直し	
18 / 水	検査手直し	
19 / 木	検査手直し	
20 / 金	検査手直し	
21 / 土	検査手直し	
22 / 日	休工	
23 / 月	検査手直し	
24 / 火	検査手直し	
25 / 水	検査手直し・引き渡し予定	
26 / 木	検査手直し・引き渡し予定	
27 / 金	検査手直し・引き渡し予定	
28 / 土		
29 / 日		
30 / 月		
31 / 火		

・近隣の皆さまへ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 伊賀市新斎苑建設工事について、左記の工事内容に基づいて行います。
 12月末に予定通り伊賀市新斎苑建設工事完工となります。
 近隣の皆様におかれましては、期間中大変ご迷惑をお掛けしましたが
 ご理解ご協力誠にありがとうございました。
 また11日から14日に関しまして乗入復旧に伴い下図青四角範囲は通行の際迂回して頂く形になります。
 残りの期間においても安全作業で努めてまいりますのでどうぞよろしく申し上げます。
 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。

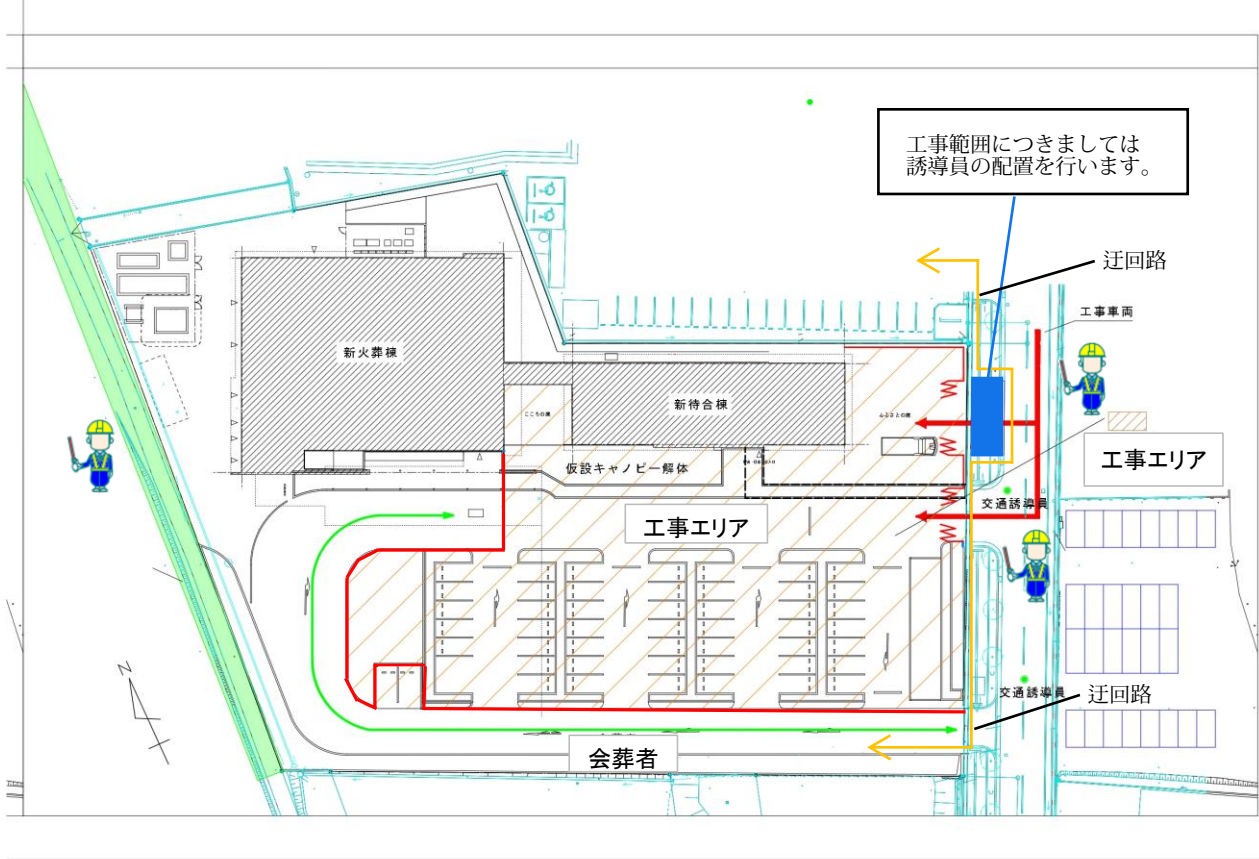

備考
 ※天候等により工程の進捗が異なる場合がございます。
 仮設事務所、鉄板につきましては1月以降に撤去予定です。

上野ハウス株式会社
 〒518-0835 三重県伊賀市緑ヶ丘南町2332番地
 TEL / FAX : 0120-21-3612
