


# 伊賀市新斎苑建設工事 3月度工事予定

| ・主要工事  |                                  | ・大型車両                    |
|--------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 / 金  | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 2 / 土  | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 3 / 日  | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 4 / 月  | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 5 / 火  | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 6 / 水  | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 7 / 木  | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 8 / 金  | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 9 / 土  | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 10 / 日 | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 11 / 月 | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4t・10tトラック |
| 12 / 火 | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4t・10tトラック |
| 13 / 水 | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4t・10tトラック |
| 14 / 木 | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 15 / 金 | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 16 / 土 | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 17 / 日 | 【火葬棟】内装工事・外構工事<br>【待合棟】内装工事・外構工事 | 8:15~17:30<br>4tトラック     |
| 18 / 月 | 検査・手直し                           | —                        |
| 19 / 火 | 検査・手直し                           | —                        |
| 20 / 水 | 手直し                              | —                        |
| 21 / 木 | 検査・手直し                           | —                        |
| 22 / 金 | 手直し                              | —                        |
| 23 / 土 | 手直し                              | —                        |
| 24 / 日 | 手直し                              | —                        |
| 25 / 月 | 手直し                              | —                        |
| 26 / 火 | 手直し                              | —                        |
| 27 / 水 | 手直し                              | —                        |
| 28 / 木 | 検査・手直し                           | —                        |
| 29 / 金 | 手直し                              | —                        |
| 30 / 土 | 手直し                              | —                        |
| 31 / 日 | 部分引渡し                            | —                        |

## ・近隣の皆さまへ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
 伊賀市新斎苑建設工事について、左記の工事内容に基づき実施する予定です。  
 先月に引き続き最終調整の為、日曜日作業をさせていただきます。  
 近隣の皆様におかれましては、期間中大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  
 工事に遅れはありましたが、3月末に予定通り新斎苑の建物の完成を迎えます。  
 工事中は何かとご迷惑をお掛けしましたが、ご協力を頂きありがとうございます。  
 新斎苑の引き渡し後ですが、4月～6月の間で新斎苑・既存斎苑の解体準備で仮設工事を行います。  
 7月より解体工事を着工します。  
 引き続きご迷惑をお掛けしますが、ご協力宜しくお願い致します。  
 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。

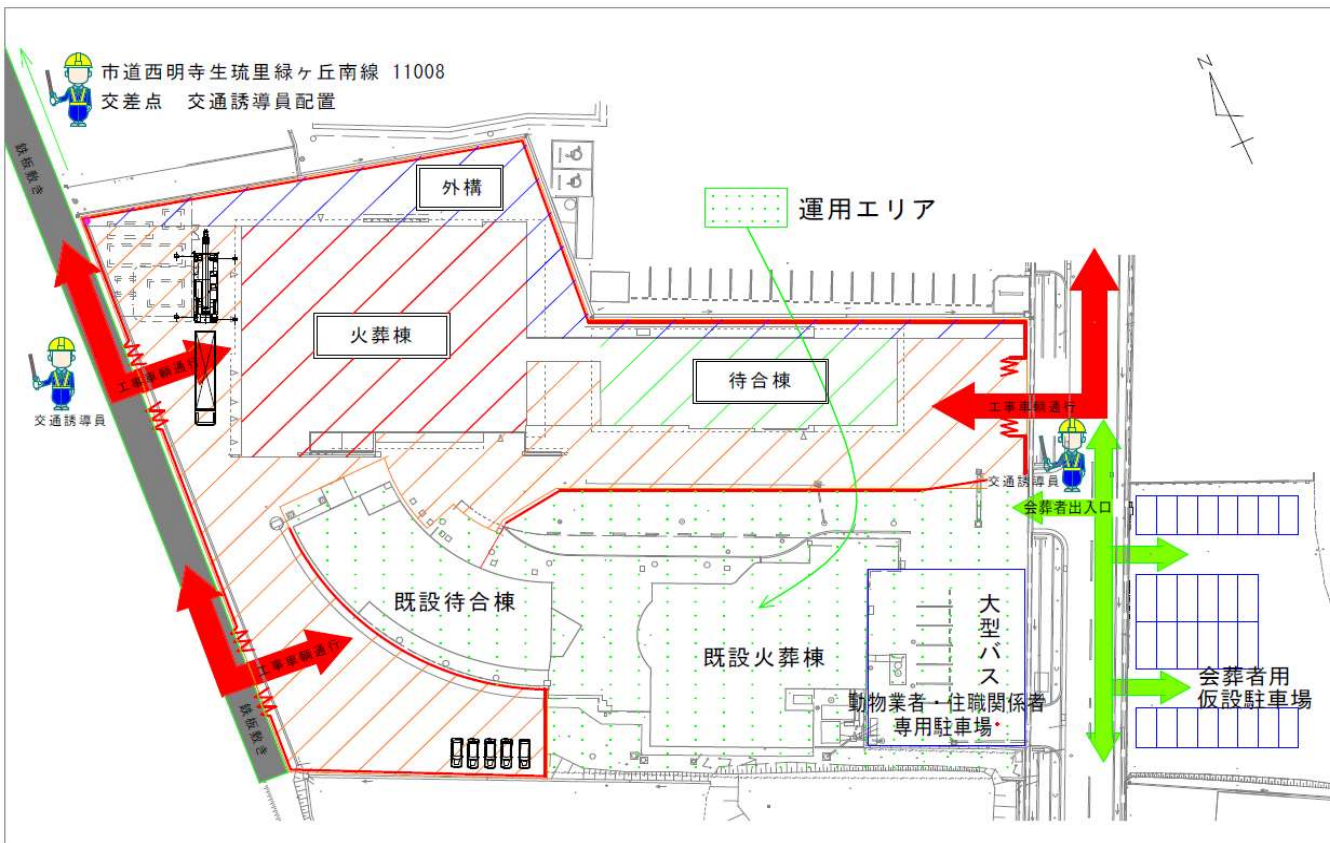

備考  
 ※3月度も引き続き日曜日の作業をさせていただきます。  
 ※伊賀芙蓉ホームページにて進捗状況を毎週更新しています。

**上野ハウス株式会社**  
 〒518-0835 三重県伊賀市緑ヶ丘南町2332番地  
 TEL / FAX : 0120-21-3612
